

Solicitação de Empenho nº 082		Ano: 2024
Recurso	_____	
Credor	UNITERRA UNIÃO TERRA PLANAGEM E CONSTRUÇÃO - LTDA	
CNPJ/CPF	02.724.778/0001-79	
Endereço	Rua da Aurora 325, Aptº 1011 Edifício Ebano – Boa Vista Recife - PE	
Histórico	Solicitação de Empenho Posterior Pagamento CONTRATO Nº 131/2023 , referente ao 3º BM , cujo objeto Serviços de CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO BEIRA RIO , deste município. Documentos em anexo.	
Nota Fiscal	770	
Valor	R\$ 889.945,81 (Oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavo)	
Banco	Banco Safra, Agência 0144, C.c 582450-4	
 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário Matricula 48.911		

Solicitação de Empenho nº 082		Ano: 2024
Recurso	_____	
Credor	UNITERRA UNIÃO TERRA PLANAGEM E CONSTRUÇÃO - LTDA	
CNPJ/CPF	02.724.778/0001-79	
Endereço	Rua da Aurora 325, Aptº 1011 Edifício Ebano – Boa Vista Recife - PE	
Histórico	Solicitação de Empenho Posterior Pagamento CONTRATO Nº 131/2023 , referente ao 3º BM , cujo objeto Serviços de CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO BEIRA RIO , deste município. Documentos em anexo.	
Nota Fiscal	770	
Valor	R\$ 889.945,81 (Oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavo)	
Banco	Banco Safra, Agência 0144, C.c 582450-4	
 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário Matricula 48.911		



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

00000770

Data e Hora de Emissão

23/04/2024 10:02:13

Código de Verificação

YC2C-BPUY

20240423:02724778000179

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.724.778/0001-79**

Inscrição Municipal: **623.333-0**

Nome/Razão Social: **UNITERRA UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA**

Endereço: **RUA DA AURORA 325, APTO 1011 EDF EBANO - BOA VISTA - CEP: 50050-000**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **financeiro@uniterraconstrutora.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**

CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **PAUDALHO 21 - CENTRO - CEP: 56826-000**

Município: **Paudalho**

UF: **PE**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BM 03 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE APUDALHO/PE. CONTRATO Nº 131/2023 - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/03/2024.

MÃO DE OBRA: R\$ 355.978,32

MATERIAL: R\$ 533.967,49

ATESTO 23/04/24
SERVIÇO FOR EXECUTADO
MATERIAL FOI ENTREGUE

IR 1,2% CONFORME ANEXO I DA IN RFB nº 1.234/12.

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

DADOS BANCÁRIOS:

422 - BANCO SAFRA

AGÊNCIA: 0144

CONTA CORRENTE: 582450-4

PIX e-mail: **FINANCEIRO@UNITERRACONSTRUTORA.COM.BR**

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 39.157,82

Retenção de IRPJ
R\$ 10.879,35

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 889.945,81

Código da Atividade Prestada

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
355.978,32	0,00	533.967,49	5,00%	26.698,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.017.05103/78



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente PREFEITURA DO PAUDALHO	BM - número 03	BM - Data emissão 22/04/2024	BM - Período de referência da medição De 01/01/2024 até 31/03/2024	Nº do CT 131/2023	Data do CT 8/9/2023
---	--------------------------	--	---	-----------------------------	-------------------------------

Início da obra - data 15/09/2023	Previsão Término obra 07/07/2024	Empresa Contratada UNITERRA - UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 02.724.778/0001-79	Fontes do recurso: PRÓPRIO
--	--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

CTEF- Valor do contrato (R\$) R\$ 3.213.053,20	Saldo atual (R\$) R\$ 1.906.988,43	Objeto do CTEF (resumido) CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	Empreendimento: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
Valor acumulado (R\$) R\$ 1.306.464,77	Valor do BM R\$ 889.945,61	Local da obra (Bairro / Município / UF) PAUDALHO/PE	

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsto no Orçamento				Diferenças e Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
		Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA													
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS				R\$ 100.161,40						R\$ 20.032,28	R\$ 30.048,42	R\$ 50.080,70	
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	10,00	R\$ 10.016,14	R\$ 100.161,40			2,00	3,00	5,00	R\$ 20.032,28	R\$ 30.048,42	R\$ 50.080,70	50,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 145.170,38						R\$ 74.333,05	R\$ 37.872,86	R\$ 112.305,91	
2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00	R\$ 311,08	R\$ 1.866,48			2,88		2,88	R\$ 895,91	R\$ 0,00	R\$ 895,91	48,00%
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	M2	480,00	R\$ 145,32	R\$ 69.753,60			226,60	123,86	350,46	R\$ 32.929,51	R\$ 17.099,33	R\$ 50.028,84	73,01%
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 792,32	R\$ 7.923,20			2,50	3,00	5,50	R\$ 1.980,80	R\$ 2.376,96	R\$ 4.367,76	55,00%
2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - (SEM COXARIFADO)	MÊS	10,00	R\$ 618,99	R\$ 6.189,90			2,50	3,00	5,50	R\$ 1.547,47	R\$ 1.856,97	R\$ 3.404,44	55,00%
2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 990,40	R\$ 9.904,00			1,00	3,00	4,00	R\$ 990,40	R\$ 2.971,20	R\$ 3.961,60	40,00%
2.6	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE - REV 04_10/2022	DIA	20,00	R\$ 912,66	R\$ 18.253,20			20,00		20,00	R\$ 18.253,20	R\$ 0,00	R\$ 18.253,20	100,00%
2.7	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL - AF_12/2022	HR	1000,00	R\$ 31,26	R\$ 31.280,00			567,00	405,00	972,00	R\$ 17.735,76	R\$ 12.668,40	R\$ 30.404,16	97,20%
2.8	EMBECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA - SINAPI 73890/002	M2		R\$ 573,78	R\$ 0,00			0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
3.0	LIMPEZA E DESTOCAMENTO				R\$ 450,00						R\$ 432,00	R\$ 18,00	R\$ 450,00	

Carlos Pinheiro Campelo
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandertei de Medonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
180638634 - 81/PE
Mat. 48.386

ROMAO SAMPAIO
ALVES:113196584
15
Assinado de forma digital por ROMAO SAMPAIO ALVES:11319658415
Dados: 2024.04.23 11:53:16 -03'00'

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	M2	1000,00	R\$ 0,45	R\$ 450,00			960,00	40,00	1.000,00	R\$ 432,00	R\$ 18,00	R\$ 450,00	100,00%
4.0	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 31.325,01						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H, AF_05/2020	M3	929,36	R\$ 27,09	R\$ 25.176,36			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	410,56	R\$ 13,56	R\$ 5.567,19			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	M3	382,54	R\$ 1,52	R\$ 581,46			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.0	OBROS DE CONCRETO ARMADO				R\$ 214.253,81						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BARRILADES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA E LUBRIFICAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	84,92	R\$ 696,26	R\$ 59.126,39			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	M2	424,60	R\$ 202,87	R\$ 86.138,60			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	1.281,00	R\$ 16,82	R\$ 21.546,42			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	3.692,00	R\$ 12,85	R\$ 47.442,20			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.0	MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA				R\$ 522.470,59						R\$ 333.472,81	R\$ 150.876,27	R\$ 484.349,08	
6.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	694,59	R\$ 752,20	R\$ 522.470,59			443,33	200,58	643,91	R\$ 333.472,81	R\$ 150.876,27	R\$ 484.349,08	92,70%
7.0	CONCRETO MAGRO				R\$ 7.423,95						R\$ 0,00	R\$ 7.387,87	R\$ 7.387,87	
7.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	16,46	R\$ 451,03	R\$ 7.423,95			0,00	16,38	16,38	R\$ 0,00	R\$ 7.387,87	R\$ 7.387,87	99,51%
8.0	TUROS DE CONCRETO ARMADO				R\$ 380.930,15						R\$ 20.996,15	R\$ 224.958,75	R\$ 245.954,90	
8.1	TURO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	636,00	R\$ 599,89	R\$ 380.930,15			36,00	375,00	410,00	R\$ 20.996,15	R\$ 224.958,75	R\$ 245.954,90	64,57%

Carlos Pinheiro Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Tel.: 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CR: 1638634 - 8 / PE
Mat. 48.386

ROMAO SAMPAIO
ALVES:113196584
Assinado de forma digital
por ROMAO SAMPAIO
ALVES:11319658415
Dados: 2024.04.23 11:53:37
-03'00'

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
9.8	ATERRO SOLO / CIMENTO				R\$ 459.210,84						R\$ 134.912,26	R\$ 249.383,98	R\$ 384.296,24	
9.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1980,18	R\$ 160,69	R\$ 318.195,12			706,68	1.273,50	1.980,18	R\$ 113.556,40	R\$ 204.638,71	R\$ 318.195,11	100,00%
9.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3		R\$ 65,13	R\$ 0,00			0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
9.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	45795,20	R\$ 2,71	R\$ 124.104,99			5.653,44	12.498,00	18.151,44	R\$ 15.320,82	R\$ 33.869,58	R\$ 40.190,40	39,64%
9.4	SOLO-CIMENTO - USINAGEM	M3	1980,18	R\$ 8,54	R\$ 16.910,73			706,68	1.273,50	1.980,18	R\$ 6.035,04	R\$ 10.875,69	R\$ 16.910,73	100,00%
10.0	LAJE DO PAVIMENTO (TRECHO 1,2 E 3)				R\$ 548.297,09						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	266,40	R\$ 641,83	R\$ 170.983,51			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	M2	68,80	R\$ 64,41	R\$ 3.787,30			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.3	ARMADA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	17362,00	R\$ 17,95	R\$ 311.468,40			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.4	CHAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	M2	1332,00	R\$ 4,36	R\$ 5.807,52			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.5	ARRREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PREFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM M	M	222,00	R\$ 253,36	R\$ 56.250,36			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.0	GUARDA - CORPO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO				R\$ 396.882,69						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	M3	31,21	R\$ 785,83	R\$ 24.519,51			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	177,60	R\$ 148,01	R\$ 26.286,57			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	KG	602,00	R\$ 13,92	R\$ 8.379,84			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2022	KG	850,00	R\$ 12,88	R\$ 10.948,00			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Carlos Pinheiro Cavalcante
Secretário Municipal de Meio Ambiente,
Urbanismo e Agrário
Mat. 46.911

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
A 180638634 - 8 / PE
Mat 48.386

ROMAO SAMPAIO
ALVES:113196584
15
Assinado de forma digital
por ROMAO SAMPAIO
ALVES:11319658415
Dados: 2024.04.23
11:53:58 -03'00'

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
			Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	
11.5	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M) COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4")	M	171,00	R\$ 285,89	R\$ 48.852,99			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.6	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEBENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS.	M	24,00	R\$ 624,72	R\$ 14.993,28			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	146,75	R\$ 175,36	R\$ 25.734,06			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	91,96	R\$ 2.309,34	R\$ 212.413,09			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.9	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M2	1532,97	R\$ 1,86	R\$ 2.844,73			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). PF_07/2020	M3XKM	1438,66	R\$ 2,50	R\$ 3.596,40			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	M2	90,00	R\$ 97,31	R\$ 8.757,90			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.12	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	60,00	R\$ 75,63	R\$ 4.537,60			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.13	TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIÉSTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM.	UND	50,00	R\$ 106,37	R\$ 5.318,50			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.0	ILUMINAÇÃO				R\$ 53.488,10						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FRANJEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	10,00	R\$ 4.389,93	R\$ 43.899,30			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	10,00	R\$ 958,88	R\$ 9.588,80			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.0	PONTILHÃO EXISTENTE				R\$ 19.913,33						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL													
13.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTLETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,03	R\$ 161,15	R\$ 488,28			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.2	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	3,03	R\$ 641,83	R\$ 1.944,74			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Bíologo e Agrônomo
Mat. 45.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Menezes Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.988

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
A 180638634 - 8/PE
Mat. 48.386

ROMAO SAMPAIO
ALVES:113196584
15
Assinado de forma digital
por ROMAO SAMPAIO
ALVES:11319658415
Dados: 2024.04.23
11:54:18 -03'00'

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	
13.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	500,00	R\$ 12,88	R\$ 6.440,00			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.4	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUCTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR52 OU SIMILAR	KG	50,00	R\$ 113,55	R\$ 5.677,50			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_06/2018	M2	188,43	R\$ 31,84	R\$ 5.362,81			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.8	PONTILHÃO PROJETADO				R\$ 108.589,87						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	77,53	R\$ 145,85	R\$ 11.307,75			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BULDRADES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	25,64	R\$ 696,26	R\$ 17.852,10			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1294,00	R\$ 11,06	R\$ 14.311,64			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	49,00	R\$ 13,92	R\$ 682,08			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	691,00	R\$ 12,88	R\$ 8.900,08			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1294,00	R\$ 11,06	R\$ 14.311,64			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	597,00	R\$ 10,99	R\$ 6.561,03			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	208,00	R\$ 12,97	R\$ 2.697,76			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	KG	112,00	R\$ 12,96	R\$ 1.451,52			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.10	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JETNE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÂBIOS POLIMÉRICOS.	M	14,00	R\$ 624,72	R\$ 8.746,08			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	71,54	R\$ 304,28	R\$ 21.768,19			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.0	PONTILHÃO PROJETADO				R\$ 3.645,51						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.1	LIMPEZA GERAL	M2	1400,00	R\$ 2,60	R\$ 3.645,51			0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.0	ITENS REPLANHADOS				R\$ 220.840,68						R\$ 0,00	R\$ 189.399,66	R\$ 21.740,07	
17.1	CARGA E DESCARGA DE MATERIAL ATERRO INCLUSO MATERIAL ARGILOSO	M3	2862,20	R\$ 65,13	R\$ 186.415,06			0,00	2.574,23	2.574,23	R\$ 0,00	R\$ 167.659,59	R\$ 167.659,59	89,94%
17.2	ENSECADORA COM EMPREGO DE SACOS DE BARRO PARA ATERRO	M3	174,44	R\$ 197,35	R\$ 34.425,60			0,00	110,16	110,16	R\$ 0,00	R\$ 21.740,07	R\$ 21.740,07	63,15%

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanismo e Agrário
Insc. 46.911

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
EA 180638634-8/PE
Mat 48.386

ROMAO SAMPAIO
ALVES:113196584
15

Assinado de forma digital
por ROMAO SAMPAIO
ALVES:11319658415
Dados: 2024.04.23 11:55:23
-03'00'

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
BOM (%) INCLUSOS NOS PREÇOS														
			TOTAIS		R\$ 3.213.053,20		-				R\$ 584.178,55	R\$ 889.945,81	R\$ 1.306.464,77	40,66%

Observações

ELP

Resp. Técnico pelo Apointamento da Obra/Serviço

Nome: **Eduardo José Vidal Marinho**

Cargo: **Engenheiro Civil**

CREA 180838634-8/PE

Mat. 48.396

[Signature]

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Cargo: **Paulo Vanderlei de Mendonça Filho**

CREA: **Engenheiro Civil**

Mat.: 41.498

[Signature]

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Nome: **Carlos Pinheiro Gomes Gouveia**

Cargo: **Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

Mat.: 46.911

ROMAO SAMPAIO Assinado de forma digital por ROMAO SAMPAIO

ALVES:113196584 ALVES:11319658415

15 Dados: 2024.04.23 11:54:41 -03'00'

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa

Nome: **UNITERRA UNIAO** Assinado de forma digital por UNITERRA UNIAO

Cargo: **TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES** TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES

LTDA:02724778000179 LTDA:02724778000179

Dados: 2024.04.23 11:54:41 -03'00'



OBJETO: CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

LOCALIZAÇÃO: PAUDALHO - PE

MAPA DE CUBAÇÃO - SOLO CIMENTO

ESTACA			SEMI-DIST.	ÁREAS (m ²)		VOLUMES (m ³)	
				CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	+	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	24,23
0	+	5,00	5,00	0,02	11,77	0,04	51,21
0	+	10,00	10,00	0,00	9,41	0,04	52,94
0	+	15,00	15,00	0,00	8,82	0,01	45,56
1	+	0,00	20,00	0,00	6,38	0,01	38,00
1	+	5,00	25,00	0,00	5,05	0,00	28,58
1	+	10,00	30,00	0,04	5,44	0,09	26,22
1	+	15,00	35,00	0,05	9,78	0,22	38,06
2	+	0,00	40,00	0,00	12,91	0,13	56,73
2	+	5,00	45,00	0,00	14,34	0,00	68,11
2	+	10,00	50,00	0,00	15,34	0,00	74,19
2	+	15,00	55,00	0,00	14,87	0,00	75,51
3	+	0,00	60,00	0,00	13,25	0,00	70,29
3	+	5,00	65,00	0,00	12,79	0,00	65,09
3	+	10,00	70,00	0,00	13,01	0,00	64,48
3	+	15,00	75,00	0,00	12,13	0,00	62,85
4	+	0,00	80,00	0,00	9,60	0,00	54,35
4	+	5,00	85,00	0,00	6,05	0,00	39,14
4	+	10,00	90,00	0,00	24,97	0,00	77,56
4	+	15,00	95,00	0,00	17,91	0,00	6,65
5	+	0,00	100,00	0,00	15,58	0,00	83,72
5	+	5,00	105,00	0,00	17,61	0,00	82,99
5	+	10,00	110,00	0,00	21,04	0,00	96,63
5	+	0,00	115,00	0,00	19,92	0,00	102,40
6	+	0,00	120,00	0,00	17,24	0,00	92,91
6	+	5,00	125,00	0,00	14,11	0,00	78,38
6	+	0,00	130,00	0,00	5,76	0,00	8,47
6	+	10,85	130,85	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

VIA	CORTE (m ³)	ATERRO (m ³)	EMPRÉSTIMO (m ³)	OBS
Estr. Da Luz	0,54	1565,25	1564,71	

Cezar Pinheiro
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Agrário
Mat. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.396

ROMAO SAMPAIO
ALVES:11319658415
8415

Assinado de forma digital por ROMAO SAMPAIO
ALVES:11319658415
Dados: 2024.04.23 11:49:28 -03'00'



OBJETO: CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO BARRIO DE PAUDALHO/PE

PERFIL - SOLO CIMENTO



Carlos Pinheiro Cavalcante Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Rua: ...
Inscr.: 45.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro CWR
Mat.: 41.498

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Eduardo José Vidal Machado
Engenheiro CWR
CREA 180638634 - 81/PE
Mat. 48.386

ROMAO SAMPAIO
ALVES:113196584
15
Assinado de forma digital
por ROMAO SAMPAIO
ALVES:11319658415
Dados: 2024.04.23 11:50:02
-03'00"



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

ENDEREÇO: PAUDALHO-PE

3º BIM

PROFONENTE: PREFEITURA DO PAUDALHO; OBJETO: CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOVIDA DA PRAÇA ESPÍRITO SANTO, BARRA RIO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

ITEM	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS									
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES					
REFERENTE AOS MESES: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO								3,00	= 3,00
TOTAL A MEDIR 3º BIM								TOTAL	= 3,00
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.2			TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M2					
TAPUME INSTALADO					56,30	x	2,20	=	123,86
TOTAL A MEDIR 3º BIM								TOTAL	= 123,86
2.3			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES					
REFERENTE AOS MESES: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO								3,00	= 3,00
TOTAL A MEDIR 3º BIM								TOTAL	= 3,00
2.4			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - (ALMOXARIFADO)	MES					
REFERENTE AOS MESES: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO								3,00	= 3,00
TOTAL A MEDIR 3º BIM								TOTAL	= 3,00
2.5			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES					
REFERENTE AOS MESES: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO								3,00	= 3,00
TOTAL A MEDIR 3º BIM								TOTAL	= 3,00
2.7			ESGOTAMENTO DE VAIA COM BOMBA SUBMERSÍVEL AF_12/2022	HR					
REFERENTE A 45 DIAS TRABALHADOS (9 HORAS POR DIA)								405,00	= 405,00
TOTAL A MEDIR 3º BIM								TOTAL	= 405,00
3.0 LIMPEZA E DESTOCAMENTO									
3.1	SINAPI		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF_05/2018	M2					
					10,00	x	4,00	=	40,00
TOTAL A MEDIR 3º BIM								TOTAL	= 40,00
6.0 MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA									
6.1			MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3					
MURO COMPLEMENTAR					47,50	x	1,15	=	81,93
MURO APOIO 1 - E1 (M6)									
BASE					7,40	x	2,25	=	24,97
CORPO					7,40	x	1,80	=	22,64
CRISTA					7,40	x	1,60	=	11,84
MURO APOIO 1 - E1 (M6)									
BASE					7,40	x	2,00	=	14,80
CORPO					7,40	x	2,20	=	32,56
CRISTA					7,40	x	1,60	=	11,84
TOTAL A MEDIR 3º BIM								TOTAL	= 200,58
7.0 CONCRETO MAGRO									
7.1			CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M2					
					410,00	x	1,20	=	24,60
TOTAL EXECUTADO								TOTAL	= 24,60
SALDO CONTRA-LIM								TOTAL	= 16,46
TOTAL A MEDIR 3º BIM								TOTAL	= 16,46

Carlos Pinheiro
Secretário Municipal
Urbanismo e Agrário
Inscr. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

ROMÃO SAMPAIO
ALVES: 11319678117

Assinado eletronicamente
por ROMÃO SAMPAIO
Assinatura: 11319678117
Emissão: 05/08/2021 11:48:21
0102



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBJETO:	CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	22/04/2024
EMPRESA:	UNITERRA-UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DA MEDIÇÃO:	03 BM



Descrição: TAPUME COM TELHA METÁLICA



Descrição: TAPUME COM TELHA METÁLICA



Descrição: LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS ESEM, SANITARIO, (NÃO, INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - (ALMOXARIFADO)



Descrição: LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS ESEM, SANITARIO, (NÃO, INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - (ALMOXARIFADO)

Genésio Pinheiro
 Secretário Municipal
 Urbano e Agrário
 Matr. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
 Engenheiro Civil
 CREA 180638634-8/PE
 Matr. 48.386

ROMAO
 SAMPAIO
 ALVES:11319658
 415

Assinado de forma digital
 por ROMAO SAMPAIO
 ALVES:11319658415
 Data: 2024.04.23
 11:50:32 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBJETO:	CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	22/04/2024
EMPRESA:	UNITERRA-UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DA MEDIÇÃO:	03 BM



Descrição: ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL.



Descrição: LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M)



Descrição: MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA



Descrição: MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

Carlos Pinheiro
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Tel.: 46.811

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 780638634 - 81 PE
Mat. 48.386

ROMAO
SAMPAIO
ALVES:11319658
415

Assinado de forma
digital por ROMAO
SAMPAIO
ALVES:11319658415
Dados: 2024.04.23
11:50:56 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBJETO:	CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	22/04/2024
EMPRESA:	UNITERRA-UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DA MEDIÇÃO:	03 BM



Descrição: TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

Descrição TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS



Descrição: TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

Descrição: TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

Carlos Pinheiro Campos
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 48.386

Eduardo José Vidal Marinho
 Engenheiro Civil
 CREA 180638634-8/PE
 Matr. 48.386

ROMAO SAMPAIO
 ALVES:113196
 58415

Assinado de forma digital por ROMAO SAMPAIO
 ALVES:11319658415
 Dados: 2024.04.23 11:51:19 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.


Relatório Fotográfico

OBJETO:	CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	22/04/2024
EMPRESA:	UNITERRA-UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DA MEDIÇÃO:	03 BM



Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%)

Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%)

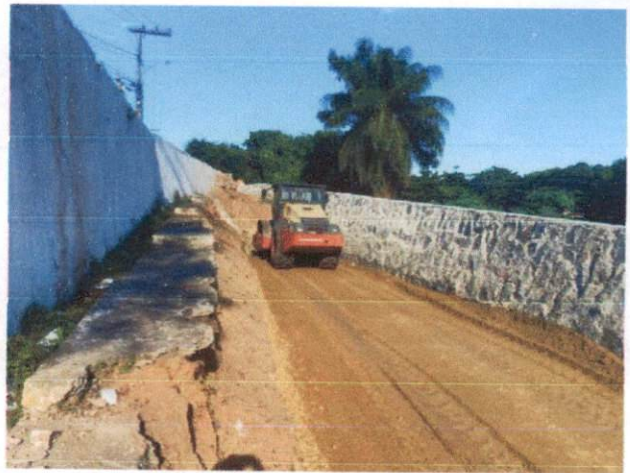

Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%)

Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%)

Carlos Pinheiro Gomes
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Matr. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.198

Eduardo José Vitorino
 Engenheiro Civil
 CREA 180638634 - B1/PE
 Matr. 48.386

ROMAO SAMPAIO
 ALVES:113196
 58415

Assinado de forma digital por ROMAO SAMPAIO
 ALVES:11319658415
 Dados: 2024.04.23 11:51:46 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBJETO:	CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	22/04/2024
EMPRESA:	UNITERRA-UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DA MEDIÇÃO:	03 BM



Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM



Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM



Descrição: SOLO-CIMENTO - USINAGEM



Descrição: SOLO-CIMENTO - USINAGEM

Carlos Pinheiro Costa
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Matr. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
 Engenheiro Civil
 CREA 180638634-8/PE
 Matr. 48.386

ROMAO SAMPAIO
 ALVES:113196
 58415

Assinado de forma digital por ROMAO SAMPAIO
 ALVES:113196:8415
 Dados: 2024.04.23 11:52:07 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBJETO:	CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	22/04/2024
EMPRESA:	UNITERRA-UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DA MEDIÇÃO:	03 BM



Descrição: CARGA E DESCARGA DE MATERIAL ATERRO INCLUSO MATERIAL ARGILOSO



Descrição: CARGA E DESCARGA DE MATERIAL ATERRO INCLUSO MATERIAL ARGILOSO



Descrição: ENSECADEIRA COM EMPREGO DE SACOS DE BARRO PARA ATERRO



Descrição: ENSECADEIRA COM EMPREGO DE SACOS DE BARRO PARA ATERRO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Melo Bonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

ROMAO
 SAMPAIO
 ALVES:113196
 58415

Assinado de forma digital por ROMAO SAMPAIO ALVES:11319658415
 Dados: 2024.04.23 11:52:32 -03'00'

Carlos Pinheiro Gouveia
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Tel.: 46.911

Eduardo José Vidal Marinho
 Engenheiro Civil
 CREA 180638634-8/PE
 Mat. 48.386
